

工事概要書



株式会社 不動テトラ

工事概要

1. 工事名 大正区船町2丁目(F-7)堤防補修工事
2. 工事期間 令和 5年 2月 7日 ~ 令和 6年 3月29日 (当初)
変更工事期間 令和 5年 2月 7日 ~ 令和 6年 8月30日 (延長)
3. 発注者 大阪港湾局
4. 受注者 株式会社不動テトラ 大阪支店
5. 施工体制 船町作業所 大阪市大正区船町2丁目1-77
(株)中山製鋼所 西船町管理センター5階
携帯電話 080-8072-0662 (池田晋)

作業所長


現場代理人・監理技術者兼務 池田 晋

工事担当 鈴木 久樹

6. 工事内容 本工事は、大正区船町2丁目(7-0)地区の堤防において雑工、補修工、付属工、仮設工及び安全管理を施工するものです。

工種	種別・細別	単位	当初数量	変更数量
雑工	床掘・運搬	m3	48	43
	攪拌・揚土・積込・運搬	m3	47	41
	既設鋼材撤去	m	10	10
	付着物撤去	m3	-	8.9
補修工	下地処理	m2	1,965	1,975
	補修鋼板溶接	m	815	2,338
	ペโตรラタム被覆	m2	1,964	1,194
	端部処理	m	1,479	928
	コンクリート撤去	m3	-	17
	水中硬化型被覆	m2	-	20
付属工	アルミニウム合金陽極取付	個	158	115
	電位測定装置	個	16	9
仮設工	足場設置・撤去	m	595	390
	コンクリート撤去足場	式	-	1
共通仮設	汚濁防止膜	式	1	1
	交通誘導員	式	1	1
	安全監視船	式	1	1
	配合試験等	式	1	1

施工図及び施工方法

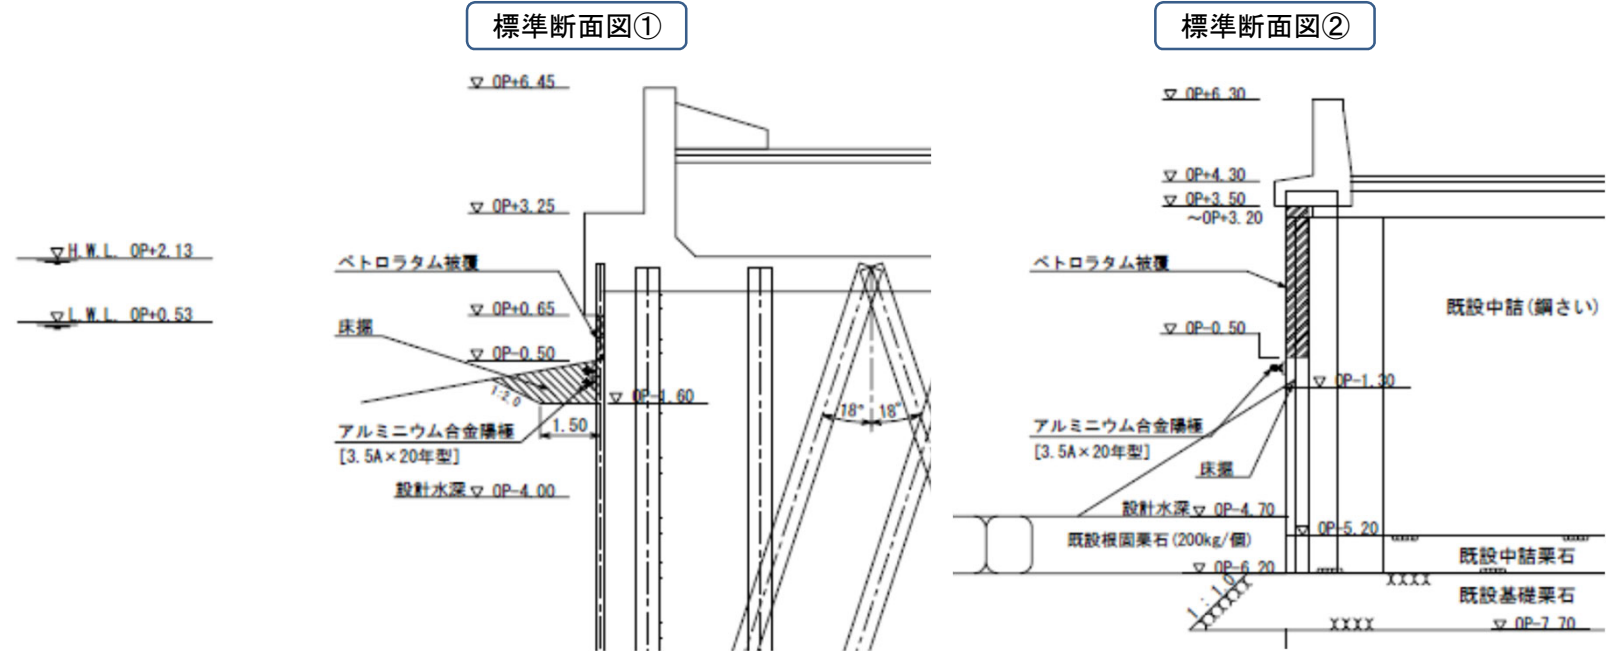

○施工方法

雑工： 補修に先立ち、堤防前面に溜まった土砂を撤去、処分します。

補修工： 腐食して穴が空いた箇所に鋼板を溶接し、腐食が進行しないように被覆防食を施工します。

付属工： 腐食を防止するアルミニウム合金陽極を堤防に取り付けます。

仮設工： 水中作業をするための足場を設置します。

施工箇所位置図



工事工程表

工種	令和5年												令和6年								備考
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
準備工	■	■																			
雑工			■	■	■	■															
補修工					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
付属工												■							■		
仮設工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
片付工																				■	

※海上作業期間中は監視船を配置し、十分な見張りと監視を行いますので、付近を航行される船舶は安全航行をお願いします。
