阪神港大阪区第６区新島建設工事に伴う航泊禁止区域内の
作業のお知らせ

問合せ先 ： 大阪港航行安全情報センター　　TEL06-6612-4363
【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　：http://www.osakaharbor-info.com/】
事業主　　： 近畿地方整備局　大阪港湾・空港整備事務所　TEL　06-6574-8562
施工者　　： 東洋・りんかい日産特定建設工業共同事業体 TEL06-6606-8522

阪神港大阪区第６区の航泊禁止区域内において、①捨石投入・均し②被覆石投入・均し③上部コンクリート打設④防砂シート敷設⑤盛砂投入⑥汚濁防止膜保守管理⑦警戒船配備の作業を行いますので、付近を航行する船舶は作業船の出入り等に十分注意のうえ航行願います。

１．工事期間及び時間

・２０１９年６月１日～２０２０年１月３１日までの間
・昼間作業：日出～日没

工　種	2019年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年 1月
護岸(1)基礎等（第１工区）									31
①捨石投入・均し									
②被覆石投入・均し									
③上部コンクリート打設									
④防砂シート敷設									
⑤盛砂投入	別件工事								
⑥汚濁防止膜保守管理									
⑦警戒船配備									
後片付工							別件工事		

２．工事内容

下図の区域内において、下記の作業を行います。
①捨石投入・均し②被覆石投入・均し③上部コンクリート打設
④防砂シート敷設⑤盛砂投入⑥汚濁防止膜保守管理
⑦警戒船配備

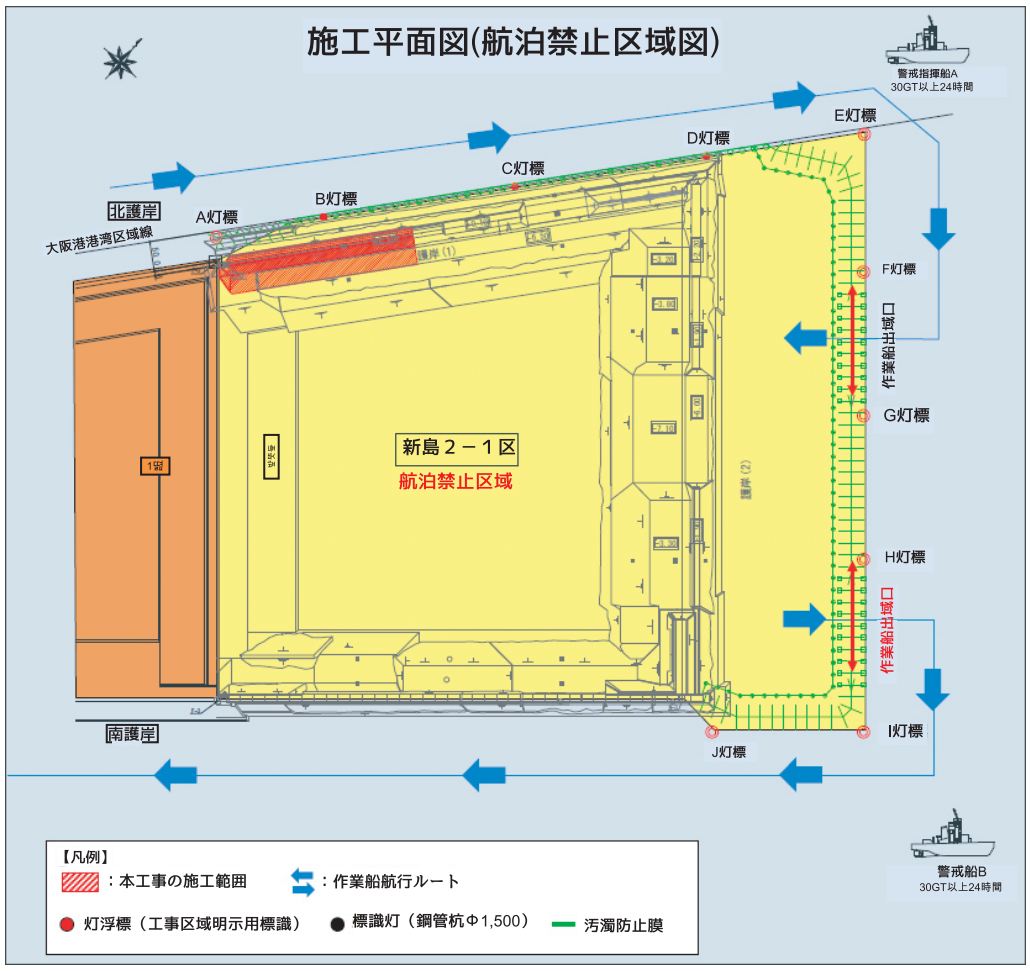

基点	大阪灯台　世界測地系 34-38-36.6N 135-22-44.7E			
イ	基点	242 度	21 分	17 秒 2,664 の地点
ロ	イ点から	318 度	00 分	52 秒 58 の地点
ハ	ロ点から	38 度	28 分	04 秒 1,083 の地点
ニ	ハ点から	137 度	29 分	25 秒 995 の地点
ホ	ニ点から	227 度	29 分	39 秒 250 の地点
ヘ	ホ点から	275 度	28 分	35 秒 247 の地点

警戒船の種別	性能・設備	隻数	警戒時間
警戒指揮船A	30GT以上(国際VHF搭載)	1	24時間
警戒船B	30GT以上	1	24時間

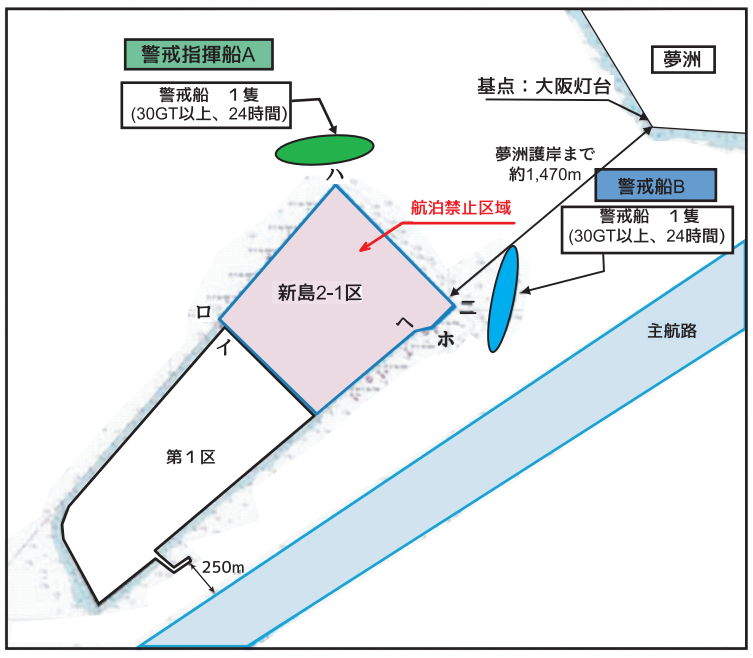

３．作業概要

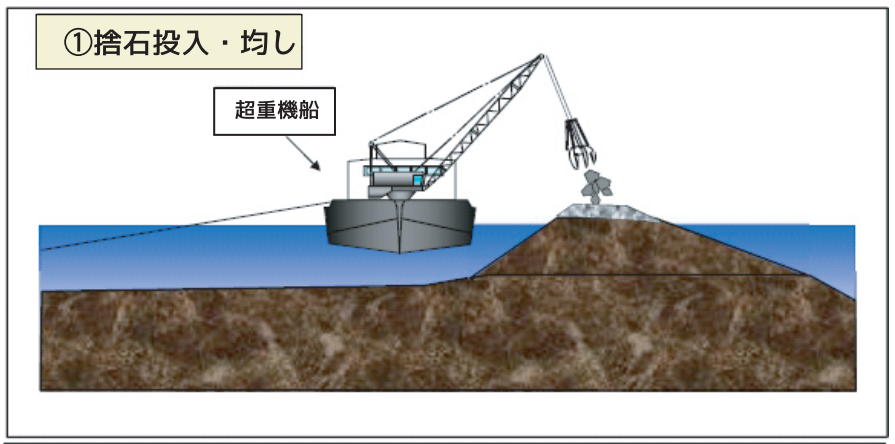

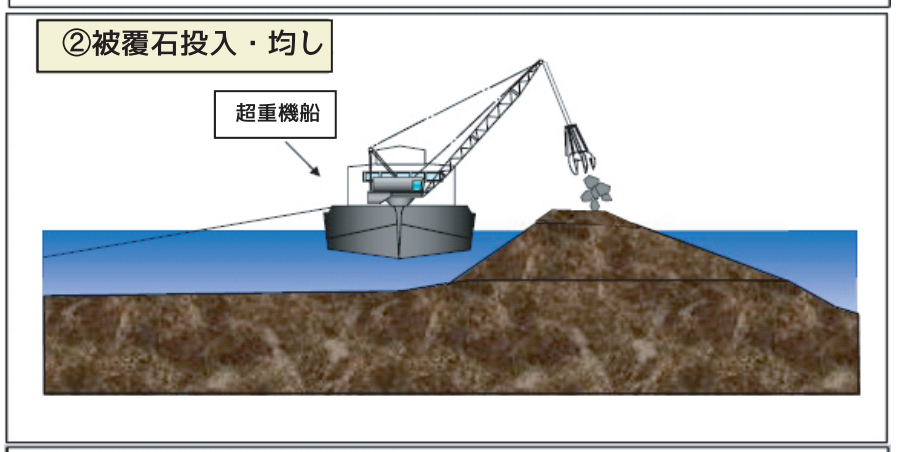

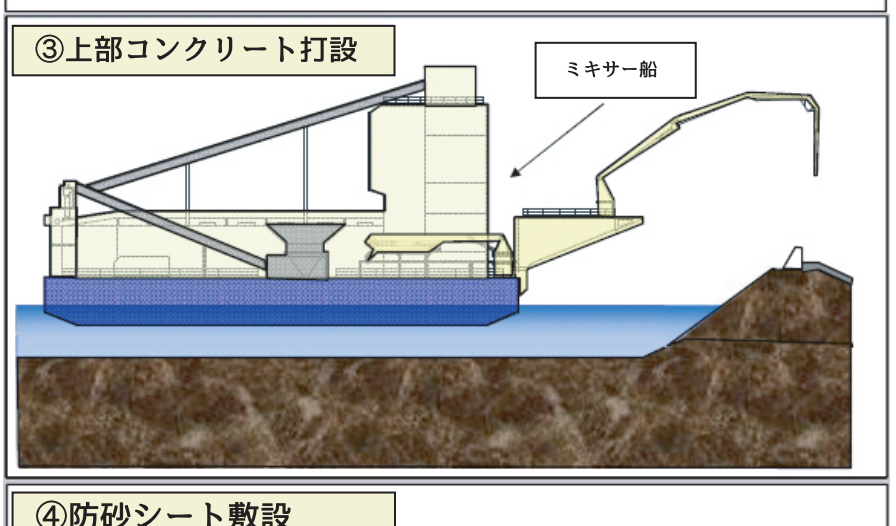

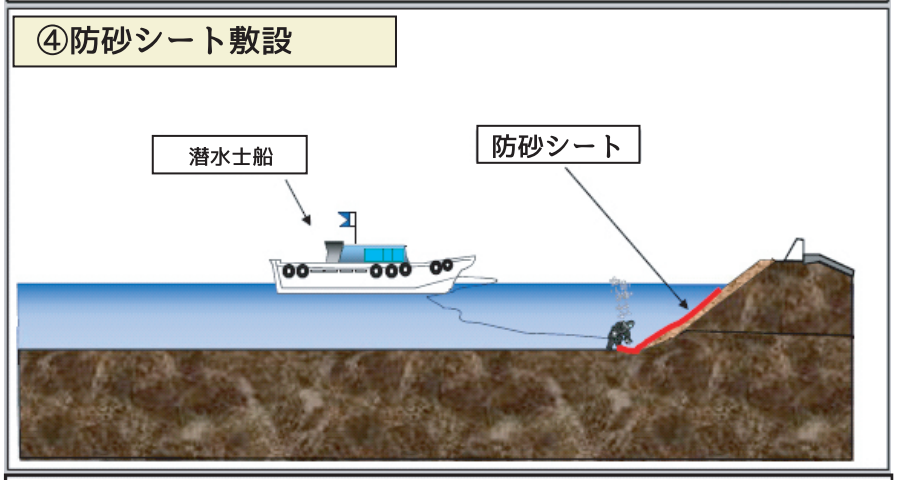

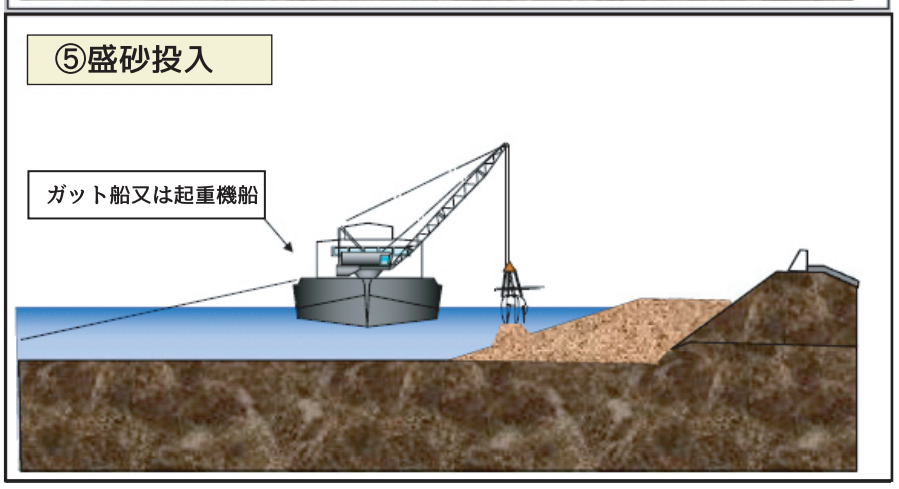

４．安全対策

（１）作業船には、海上衝突予防法に規定する灯火・形象物を掲げるとともに、①行き先標示旗を掲揚します。
（２）潜水作業時には、警戒船（4.9GT級）を1隻配置します。
（３）潜水作業中は②国際信号「Ａ旗」を掲げます。
（４）2019年6月1日～2019年10月31日の期間において、③警戒船旗を掲揚した警戒船を下図のように配備し、付近の航行船舶に注意を喚起します。(その他の期間の警戒船は、別件工事にて配置)

①行き先標示旗



②国際信号「A旗」

③警戒船旗
